






О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(R1-78) Дорожная сеть (Ярославская область)"





Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	37.48	37.48	37.48	38.9	40.08	40.08	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Акты ввода автомобильных дорог регионального значения" Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Выполнено
2		Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	59.81	60.07	60.07	64.75	65.47	64.92	100,85%	Подтверждающие документы: 1. "Акты ввода дорожной сети городской агломерации "Ярославская"" Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл.
3		Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Процент	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0,37	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Расчет показателя" Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 31.12.2017г. №б/н, приложен файл.
4		Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Процент	90	106	106	25	85	85	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Сведения об аварийно-опасных участках (местах концентрации ДТП) за 11 месяцев 2020 года" Иное ГИБДД УМВД России по Ярославской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл. В подтверждающем документе данные по местам концентрации ДТП сформированы на 01.12.2020. В связи с особенностями учета пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях фактическое значение показателя

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
										«Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» за год будет сформировано до конца января.	
5		Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.	Штука	68	81	81	19	65	65	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Сведения об аварийно-опасных участках (местах концентрации ДТП) за 11 месяцев 2020 года" Иное ГИБДД УМВД России по Ярославской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл. В подтверждающем документе данные по местам концентрации ДТП сформированы на 01.12.2020. В связи с особенностями учета пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях фактическое значение показателя «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» за год будет сформировано до конца января.
6		Протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям,	Километр; тысяча метров	631.2	634.2	634.2	683.626	691.189	685.383	100,85%	Подтверждающие документы: 1. "Акты ввода дорожной сети городской агломерации "Ярославская"" Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл.
7		Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Километр; тысяча метров	2355.207	2355.207	2355.207	2445.218	2518.632	2518.589	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Акты ввода автомобильных дорог регионального значения" Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Выполнено
8		Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Километр; тысяча метров		23.22	23.22	23.22	23.22	23.22	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Расчет показателя" Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 31.12.2017г. №б/н, приложен файл. Выполнено

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

■ Фактически исполнено

■ Риски исполнения

■ Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.


Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(05) На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</i>	3 987 219,19	3 987 219,19	3 987 219,19	2 804 223,64	3 927 607,42	98,50	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 987 219,19	3 987 219,19	3 987 219,19	2 804 223,64	3 927 607,42	98,50	Финансирование исполнено на 100%. Невостребованная экономия от расторжения контрактов и затрат заказчика.
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 829 807,10	3 829 807,10	3 829 807,10	2 646 811,55	3 775 644,03	98,59	Финансирование исполнено на 100%. Невостребованная экономия от расторжения контрактов и затрат заказчика.
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных	1 508 218,04	1 508 218,04	1 508 218,04	338 218,04	1 499 182,82	99,40	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		образований							
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	1 665 630,13	1 665 630,13	1 665 630,13	495 630,13	1 651 146,21	99,13	Финансирование исполнено на 100%. Невостребованная экономия от расторжения контрактов и затрат заказчика.
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		<i>(09) На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)</i>	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	285 944,66	97,93	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	285 944,66	97,93	Невостребованная экономия от расторжения контракта и затратам заказчика Невостребованная экономия от расторжения контракта и затрат заказчика
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	285 944,66	97,93	Невостребованная экономия от расторжения контракта и затрат заказчика

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	285 944,66	97,93	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	285 944,66	97,93	Невостребованная экономия от расторжения контракта и затрат заказчика
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 279 219,19	4 279 219,19	4 279 219,19	2 804 223,64	4 213 552,08	98,47	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 279 219,19	4 279 219,19	4 279 219,19	2 804 223,64	4 213 552,08	98,47	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 121 807,10	4 121 807,10	4 121 807,10	2 646 811,55	4 061 588,69	98,54	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 800 218,04	1 800 218,04	1 800 218,04	338 218,04	1 785 127,48	99,16	
бюджеты муниципальных образований			1 957 630,13	1 957 630,13	1 957 630,13	495 630,13	1 937 090,87	98,95	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений









 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020	 7
2		На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021	 3
3		Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020	 2
4		На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	 5


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений





 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Значение: 1, на дату 01.12.2020	01.12.2020	18.12.2020	Моисеев Е. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты ввода автомобильных дорог регионального значения" Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Акты ввода дорожной сети городской агломерации "Ярославская"" Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл. Просрочка 17 дней. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2020	14.02.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Просрочка 13 дней. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт регионального проекта "Дорожная сеть" Ярославской области (Актуализирован на 2020 год)" Иной вид документа Проектный комитет от 14.02.2020г. №б/н, приложен файл.
1.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.05.2020	25.05.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракты" Контракт Департамент дорожного хозяйства ЯО от 25.05.2020г. №б/н, приложен файл.
1.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	01.11.2020	18.12.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Просрочка 47 дней. Подтверждающие документы: 1. "Акты ввода автомобильных дорог регионального значения" Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Акты ввода дорожной сети городской агломерации "Ярославская"" Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл.
1.4.	РРП		Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов за 2019 год	15.01.2020	13.01.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении ИМБТ за 2019 год" Отчет Федеральное дорожное агентство от 13.01.2020г. №108-17-2019-076/02, приложен файл.
1.5.	РРП		Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2020	16.03.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении в 2020 году бюджету муниципальных образований субсидии на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации "Ярославская"" Соглашение Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 16.03.2020г. №20-БКАД, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «27» мая 2019 года № 78701000-1-2019-006" Соглашение Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 03.02.2020г. №78701000-1-2019-006/4, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении в 2020 году бюджету

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района субсидии на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская»" Соглашение Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 16.03.2020г. №15-2-БКАД/20, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении в 2020 году бюджету Ярославского муниципального района субсидии на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская»" Соглашение Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 16.03.2020г. №17-1-БКАД/20, приложен файл.
1.6.	РРП		Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2020	15.04.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План мероприятий, направленных на пропаганду безопасности и соблюдения Правил дорожного движения на 2020 год" Иной вид документа Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 15.04.2020г. №б/н, приложен файл.
1.7.	РРП		Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2020	30.11.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Виджит СОУ "Эталон" Укладка А/Бетон и др. типов покрытий" Иное Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 30.11.2020г. №б/н, указана ссылка.
1.7.1	РРП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.07.2020	25.06.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "СОУ "Эталон" Виджит "Укладка А/Бетон и др. типов

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							покрытий"" Иное Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 30.06.2020г. №б/н, указана ссылка.
1.7.2	РРП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.08.2020	31.07.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Виджит "Укладка А/Бетон и др. типов покрытий" в СОУ "Эталон" " Иное Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 31.07.2020г. №б/н, указана ссылка.
1.7.3	РРП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.09.2020	31.08.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Виджит в СОУ "Эталон" - "Укладка Укладка А/Бетон и др. типов покрытий"" Иное Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 31.08.2020г. №б/н, указана ссылка.
1.7.4	РРП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.10.2020	30.09.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Виджит "Укладка А/Бетон" и др. типов покрытий" в СОУ "Эталон"" Иное Департамент дорожного хозяйства от 30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.
1.7.5	РРП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.11.2020	30.10.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Виджит в СОУ "Эталон" - "Укладка А/Бетон и др. типов покрытий"" Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 30.10.2020г. №б/н, указана ссылка. Фактическая доля укладки верхних слоев дорожной одежды на 30.10.2020 составляет 98,67%

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.			<i>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Значение: 1, на дату 01.12.2021</i>	01.12.2021	01.12.2021	Моисеев Е. А.	Информация по значению результата: В работе. В работе. Риск не достижения результата отсутствует Предоставлена информация : 1 из 1.
2.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2021	01.02.2021	Моисеев Е. А.	В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует
2.2.	РРП		Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов за 2020 год	15.01.2021	15.01.2021	Моисеев Е. А.	В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует.
2.3.	РРП		Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2021	17.03.2021	Моисеев Е. А.	В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует
3.			<i>Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том</i>	15.12.2020	02.12.2020	Моисеев Е. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Федеральным дорожным агентством утверждены изменения регионального проекта "Дорожная сеть" Ярославской области в СОУ "Эталон" Иное ФДА Росавтодор от 02.12.2020г. №БП-383, указана ссылка.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период Значение: 1, на дату 15.12.2020</i>				Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.	РРП		Документ разработан	01.12.2020	30.11.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт регионального проекта "Дорожная сеть" Иное от г. №, приложен файл.
3.2.	РРП		Документ утвержден (подписан)	15.12.2020	02.12.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Федеральным дорожным агентством утвержден региональный проект "Дорожная сеть" Ярославской области в СОУ "Эталон" Иное ФДА Росавтодор от 02.12.2020г. №БП-383, указана ссылка.
4.			<i>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) Значение: 1, на дату</i>	31.12.2020	07.12.2020	Моисеев Е. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" г. Ярославля от 07.12.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			31.12.2020				
4.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.09.2020	01.10.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2020 №297-п (Региональная целевая программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская")" Постановление Правительство Ярославской области от 10.09.2020г. №728-п, приложен файл.
4.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	15.10.2020	15.10.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «27» мая 2019 года № 78701000-1-2019-006" Соглашение Департамент дорожного хозяйства ЯО от 14.09.2020г. № 78701000-1-2019-006/5, приложен файл. 2. "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Капитальному ремонту путепровода через железнодорожные пути по улице Добрынина в городе Ярославле " Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 20.08.2019г. №МК 39-ЭА-19, приложен файл.
4.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	07.12.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки выполненных работ" Иное "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							07.12.2020г. №б/н, приложен файл.
4.4.	РРП		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	30.09.2020	01.10.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "О выделении иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства РФ" Распоряжение Правительство Российской Федерации от 19.06.2020г. № 1643-р, приложен файл.
4.5.	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	30.09.2020	01.10.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ярославской области от 02.04.2019 № 108-17-2019-076" Соглашение Федеральное дорожное агентство от 14.08.2020г. №108-17-2019-076/3, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

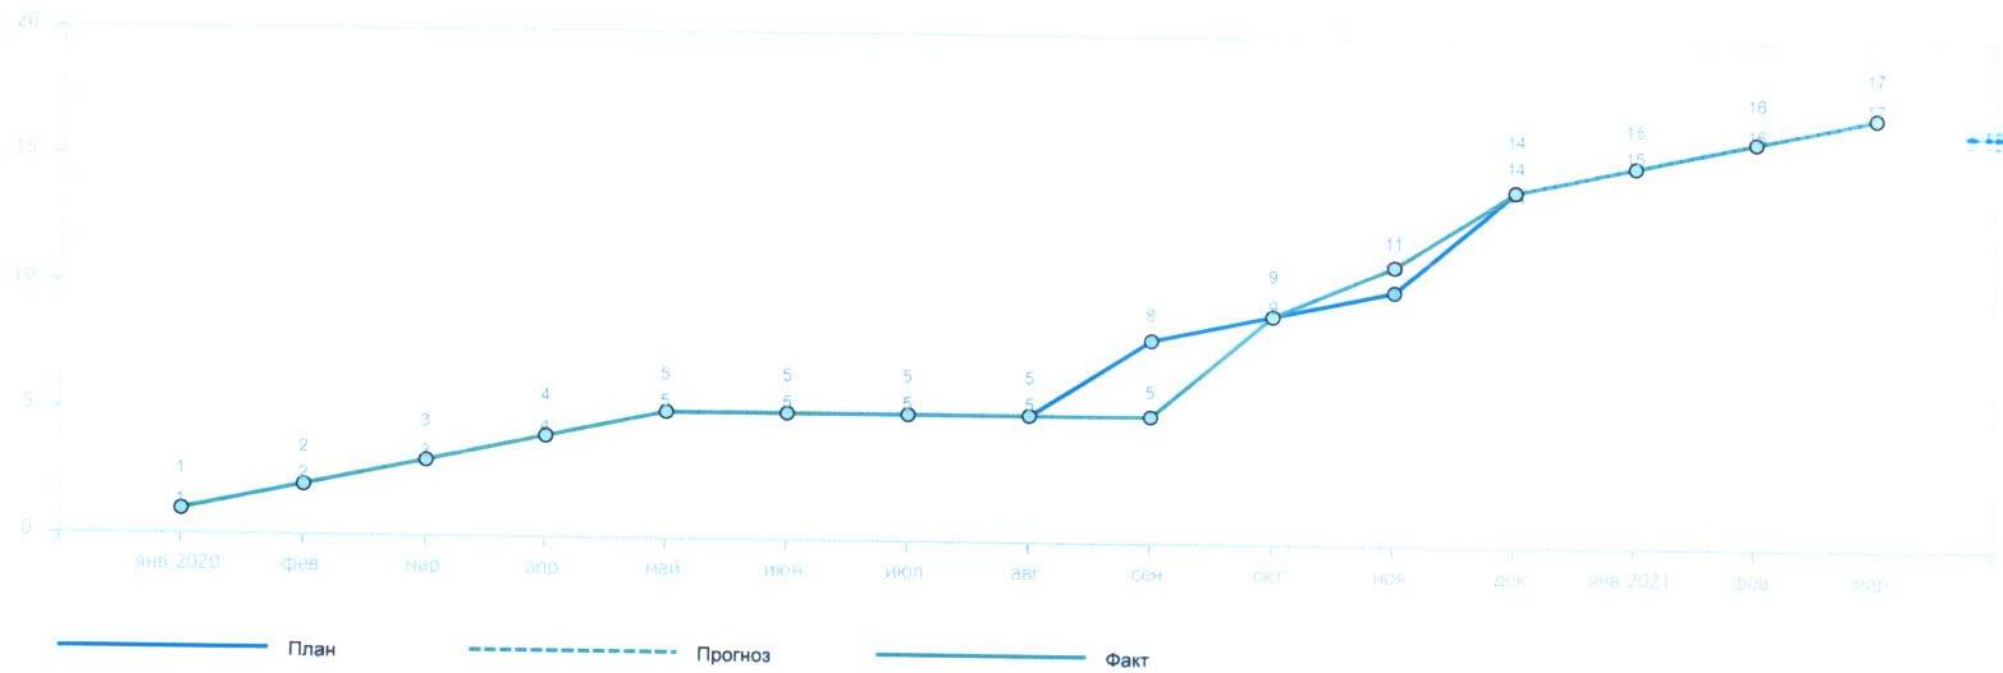


Рис. 1. "(R1-78) Дорожная сеть (Ярославская область)"

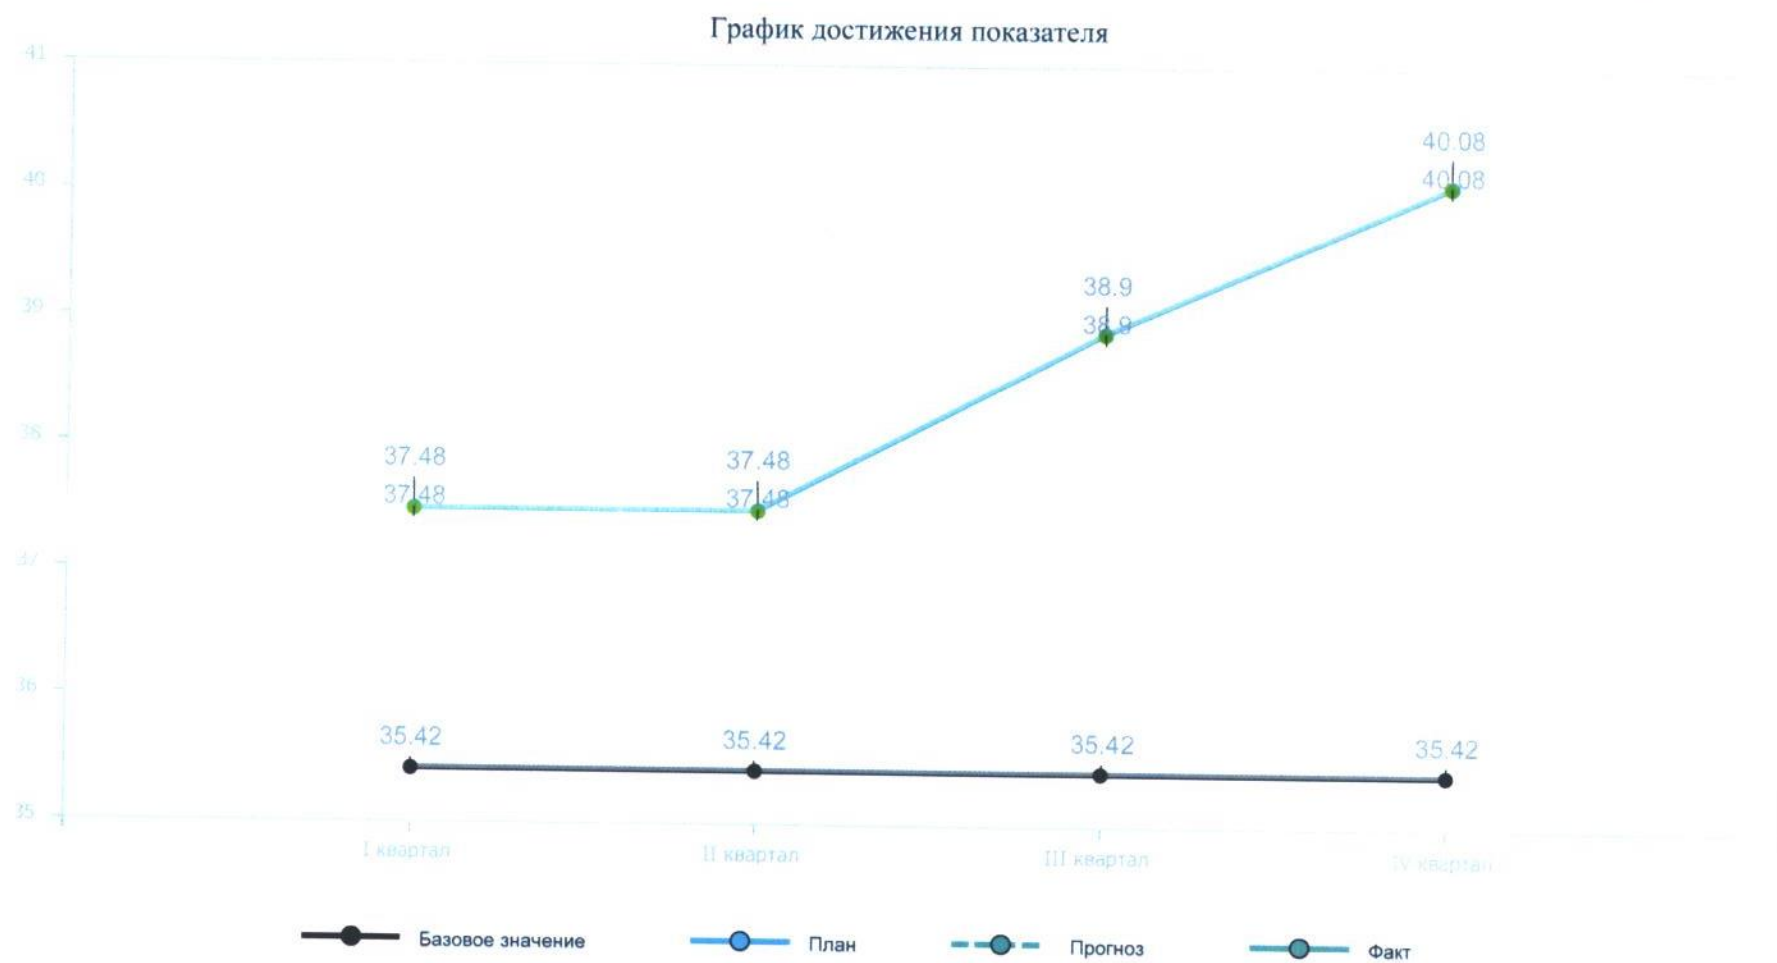


Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Диаграмма достижения показателя

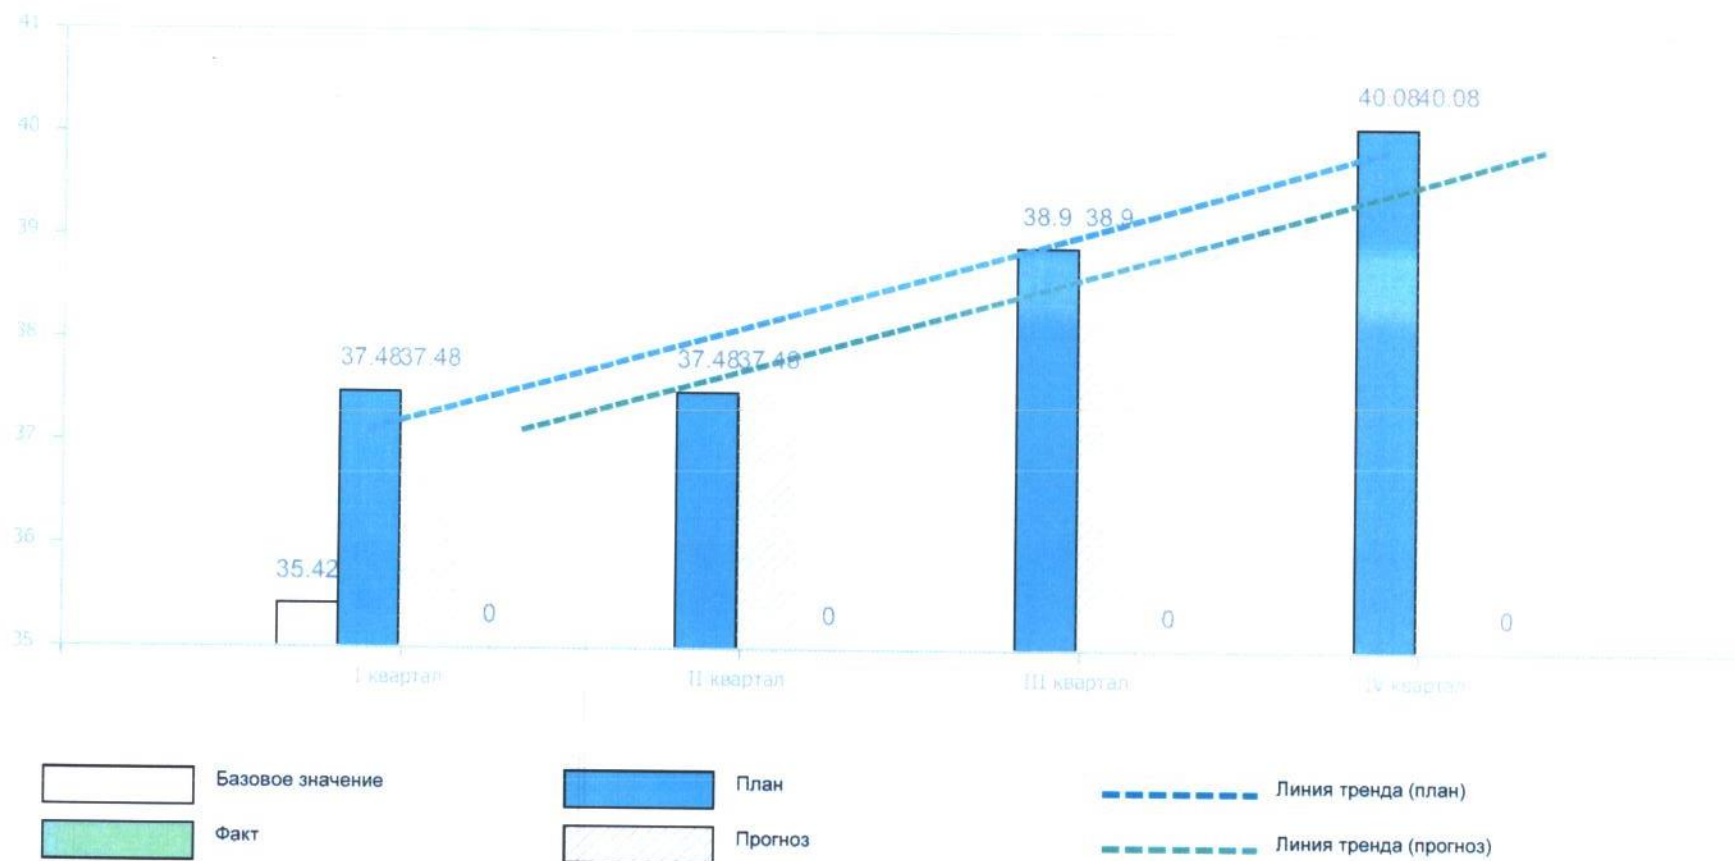


Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

График достижения показателя



Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Диаграмма достижения показателя

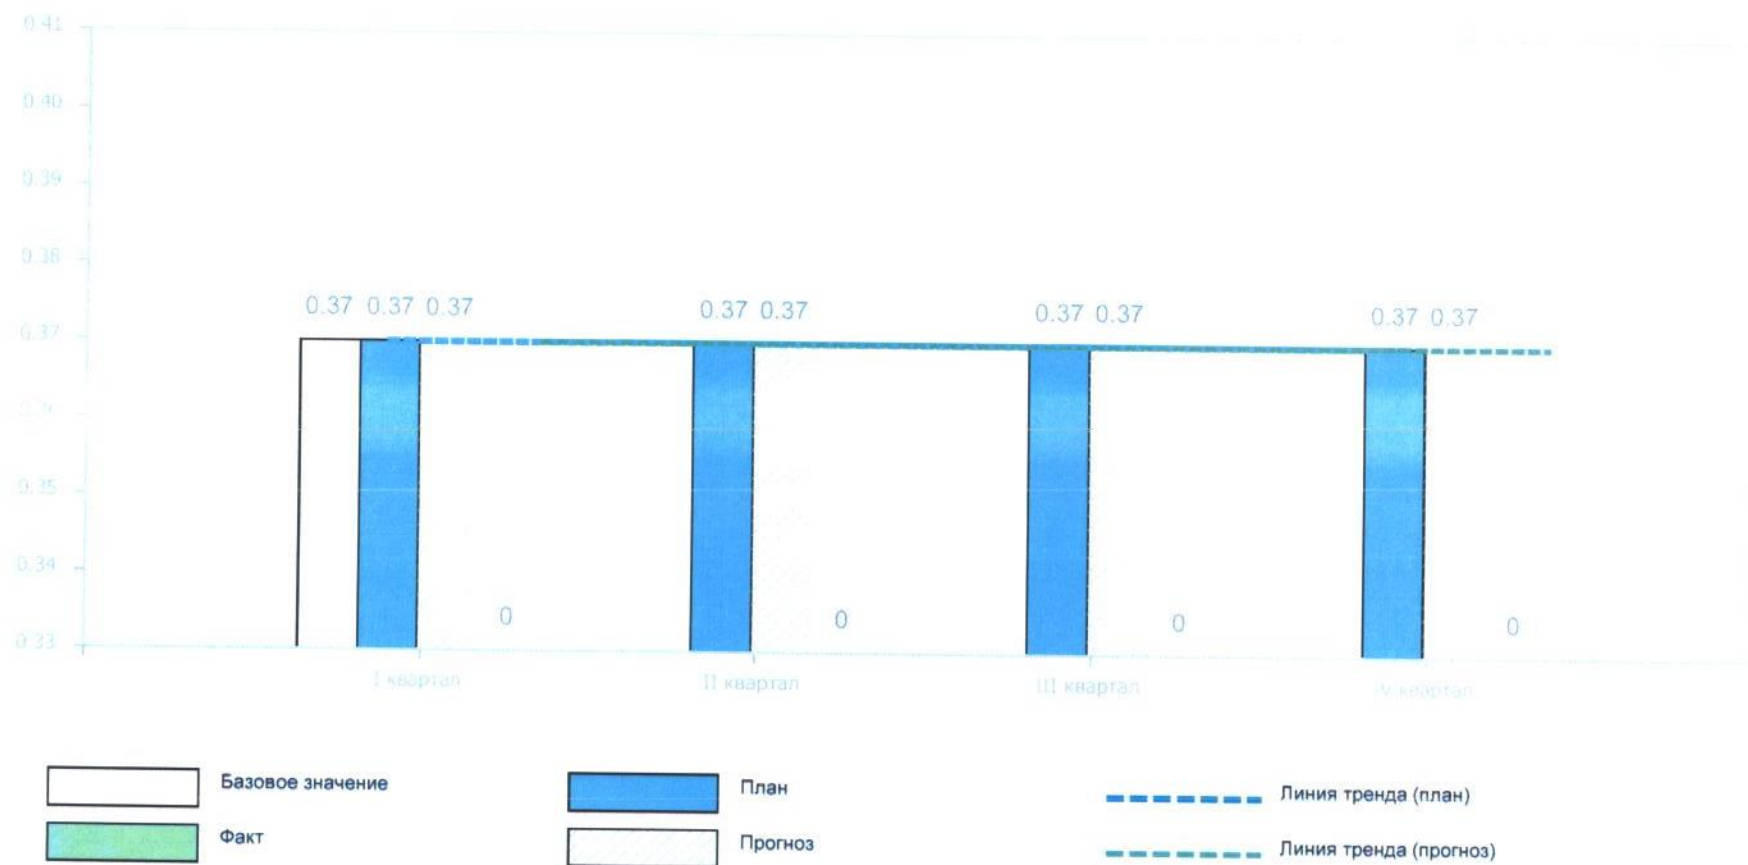


Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

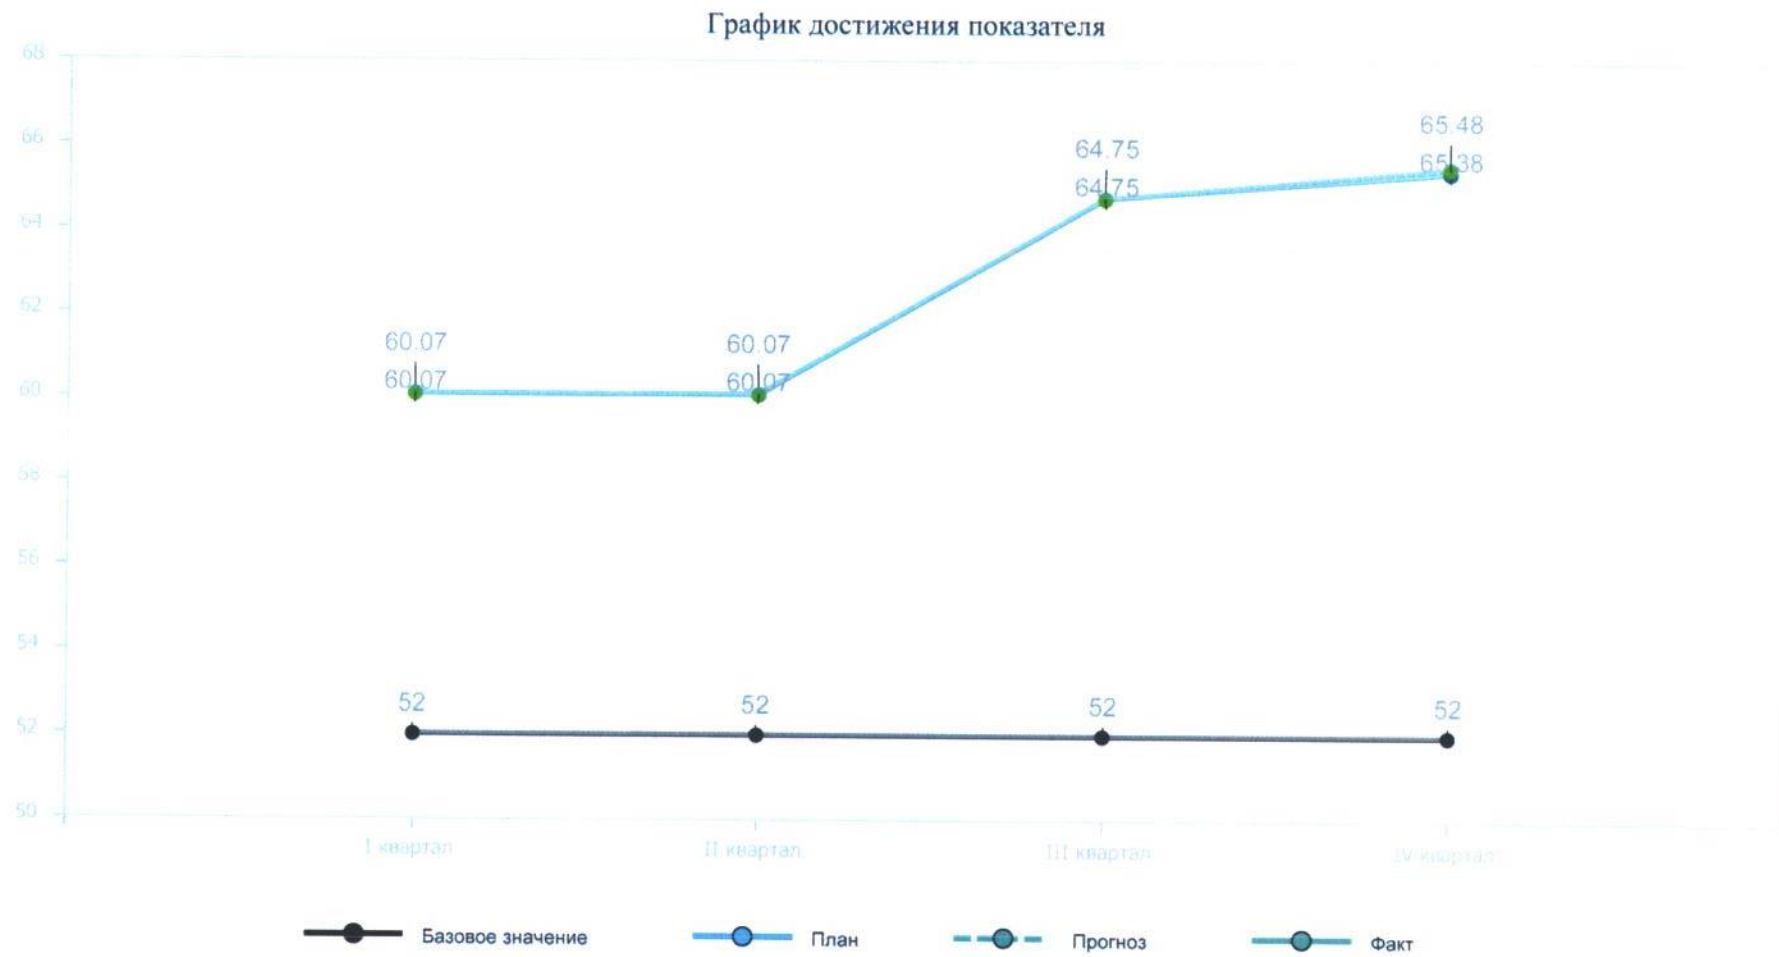


Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Диаграмма достижения показателя

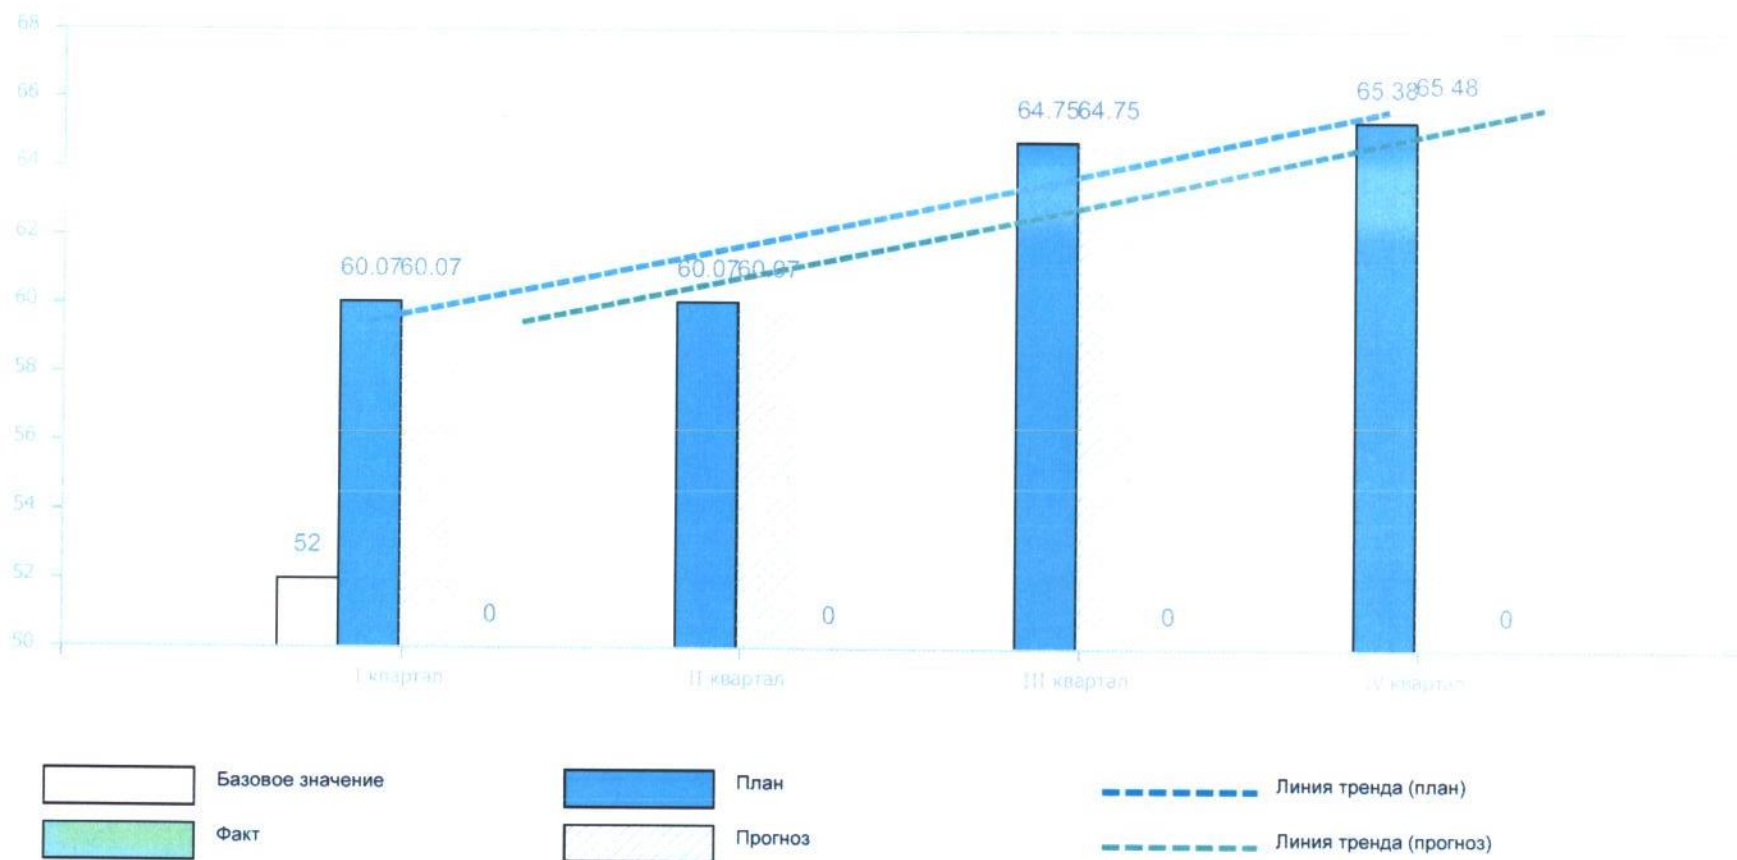


Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

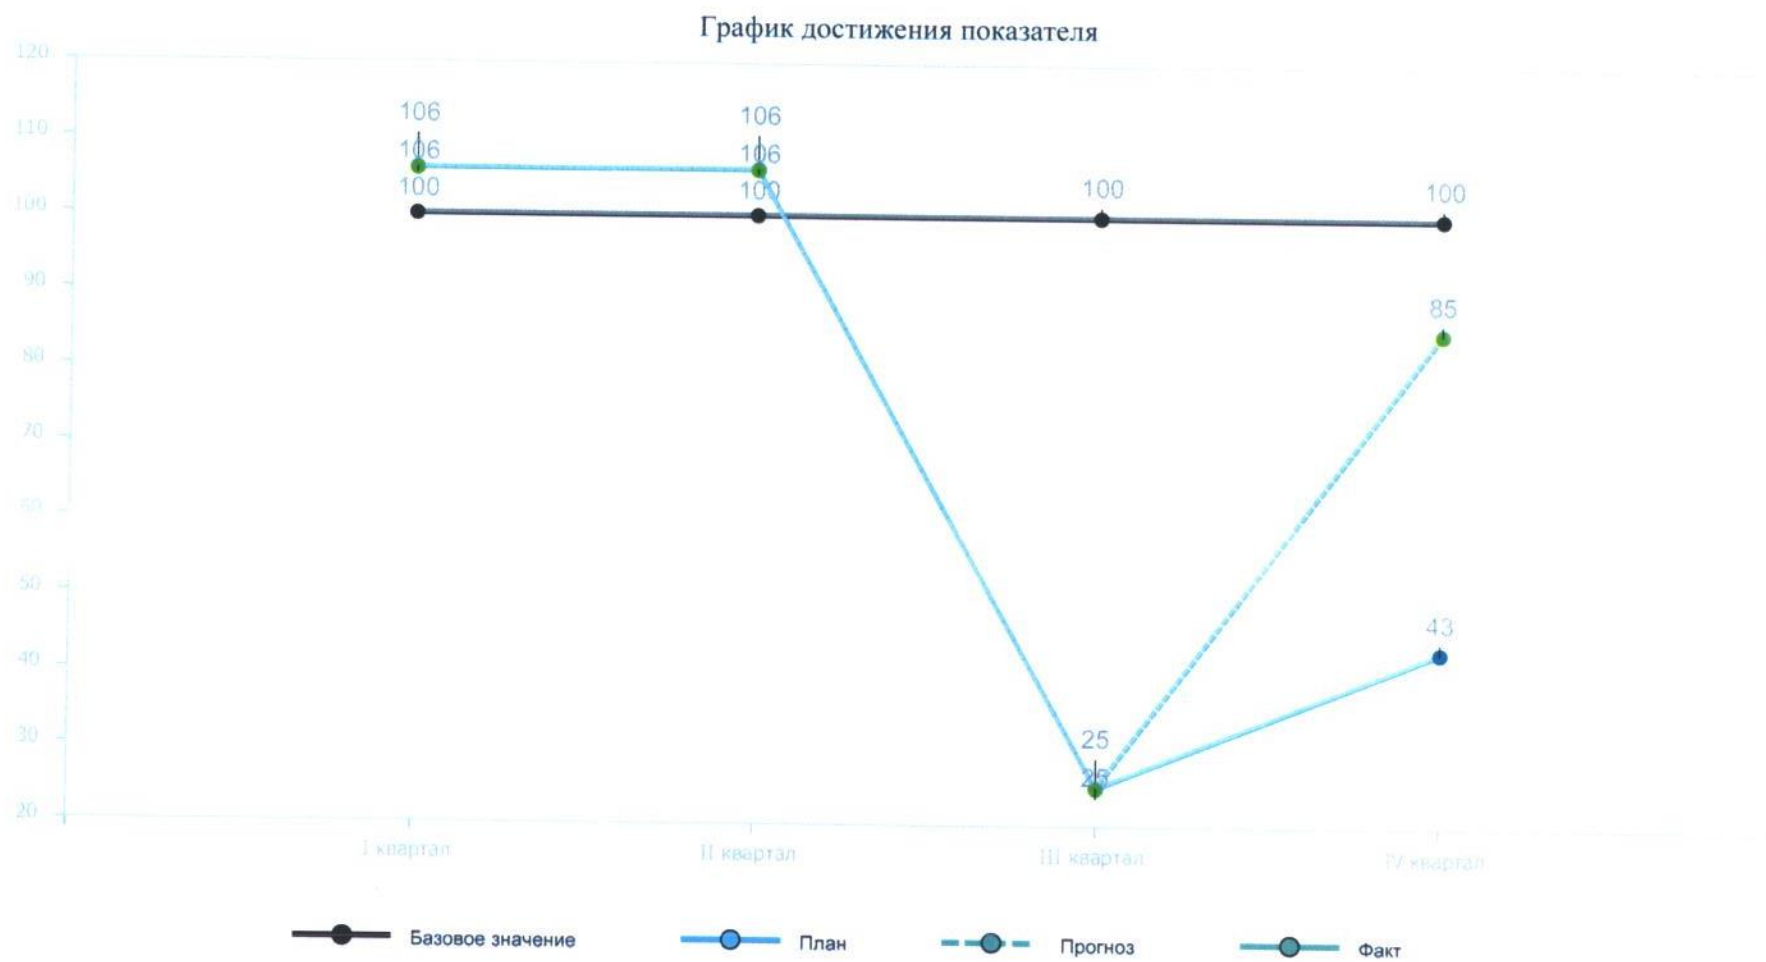


Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Диаграмма достижения показателя

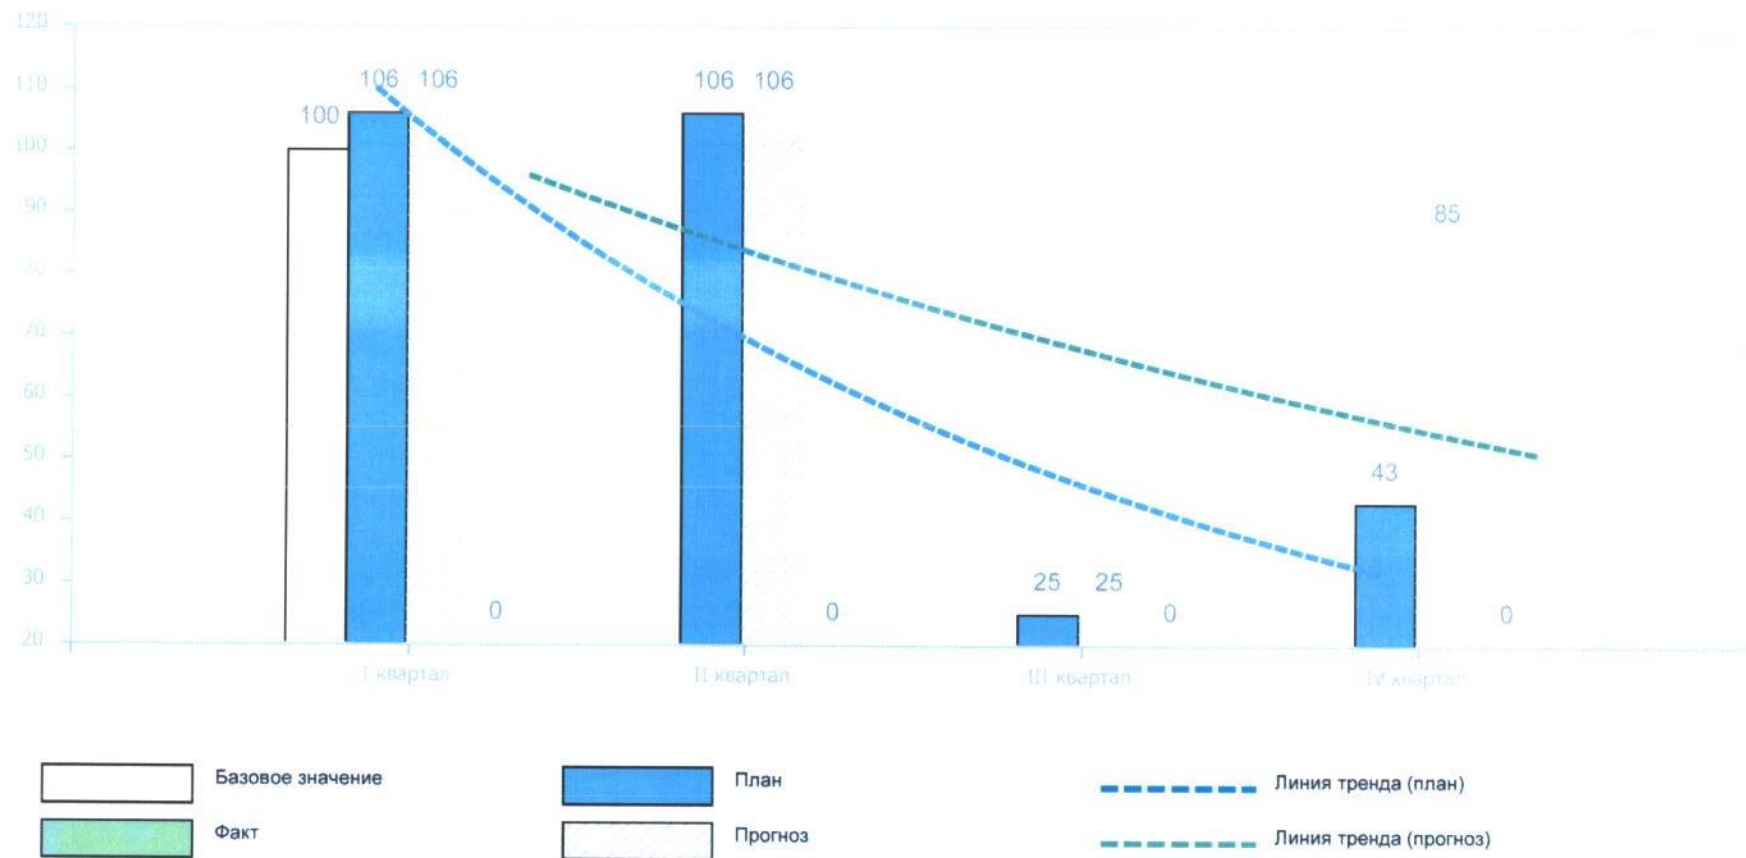


Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

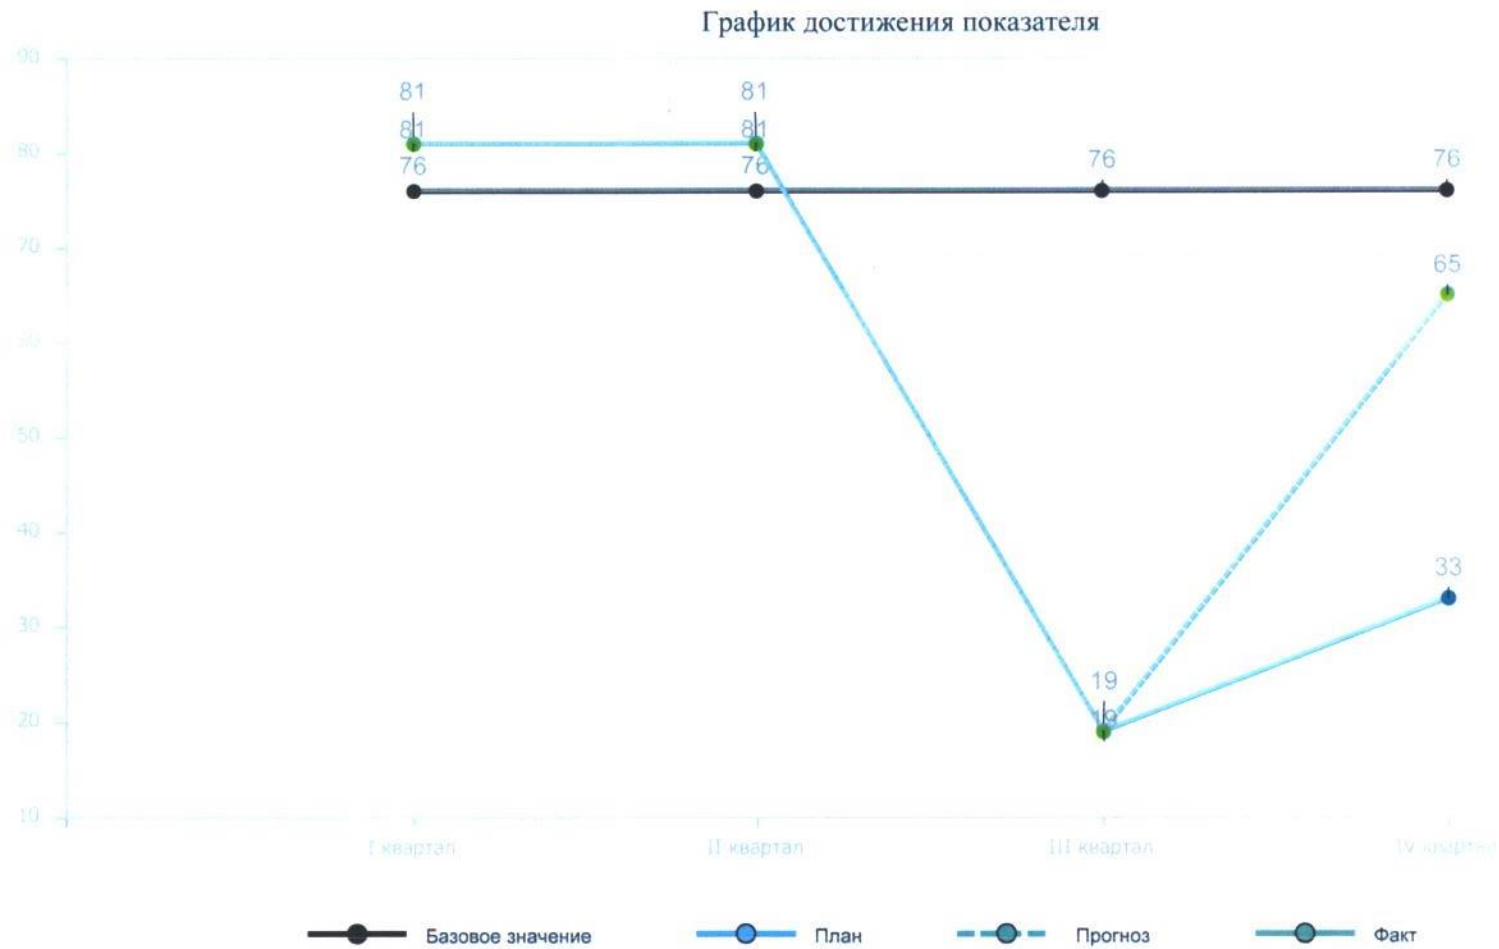


Рис. 9. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.

Диаграмма достижения показателя

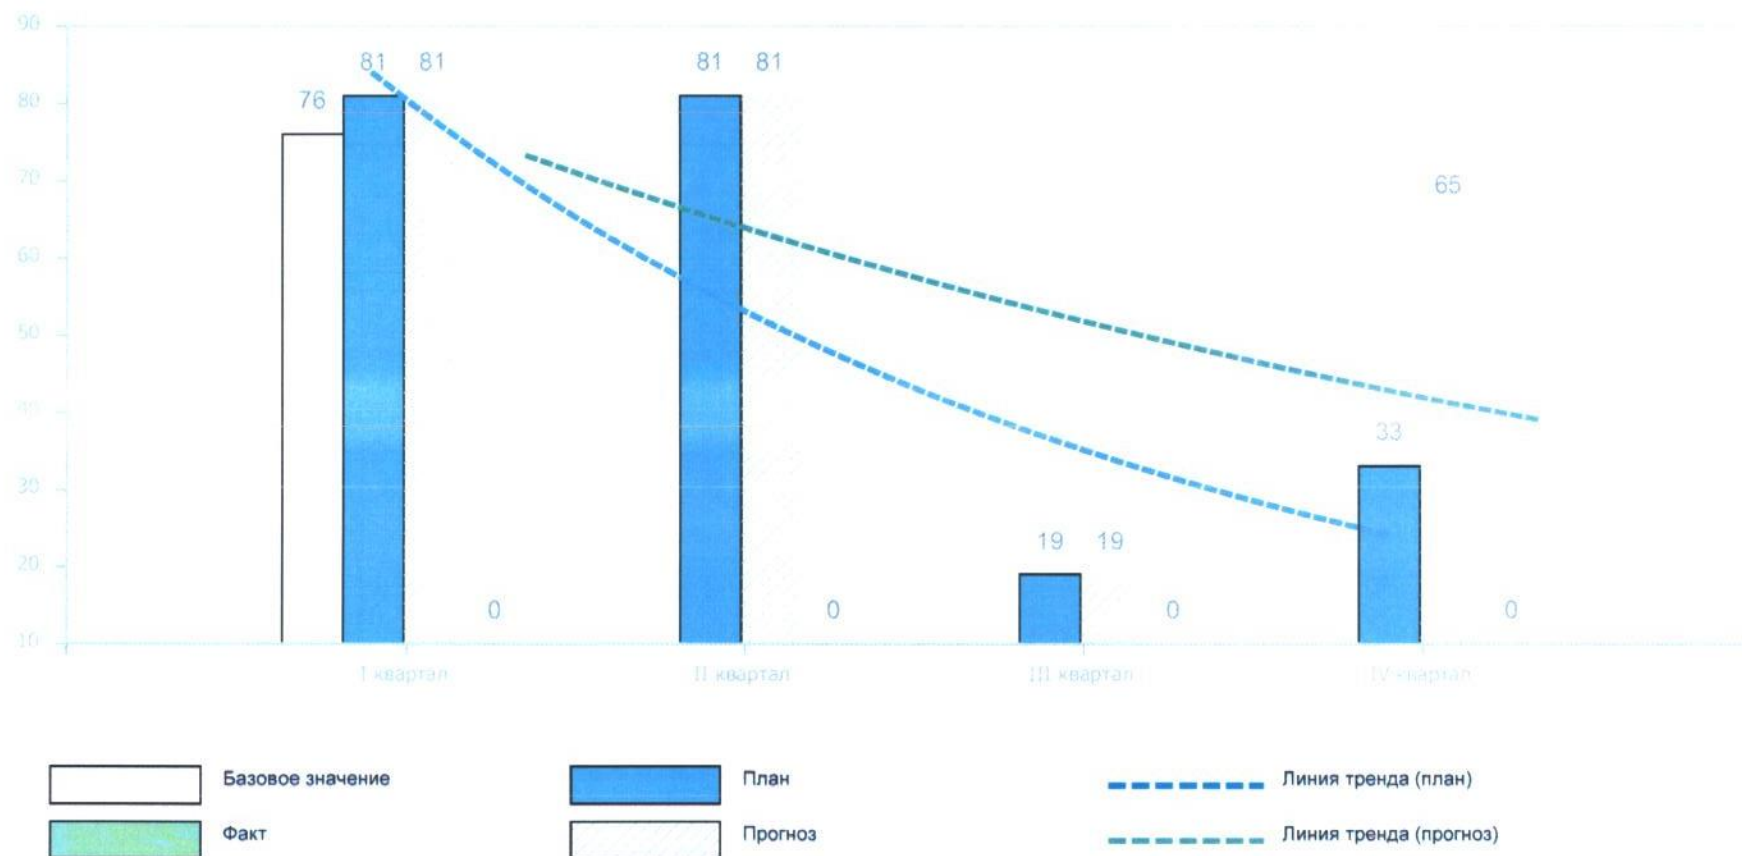


Рис. 10. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.

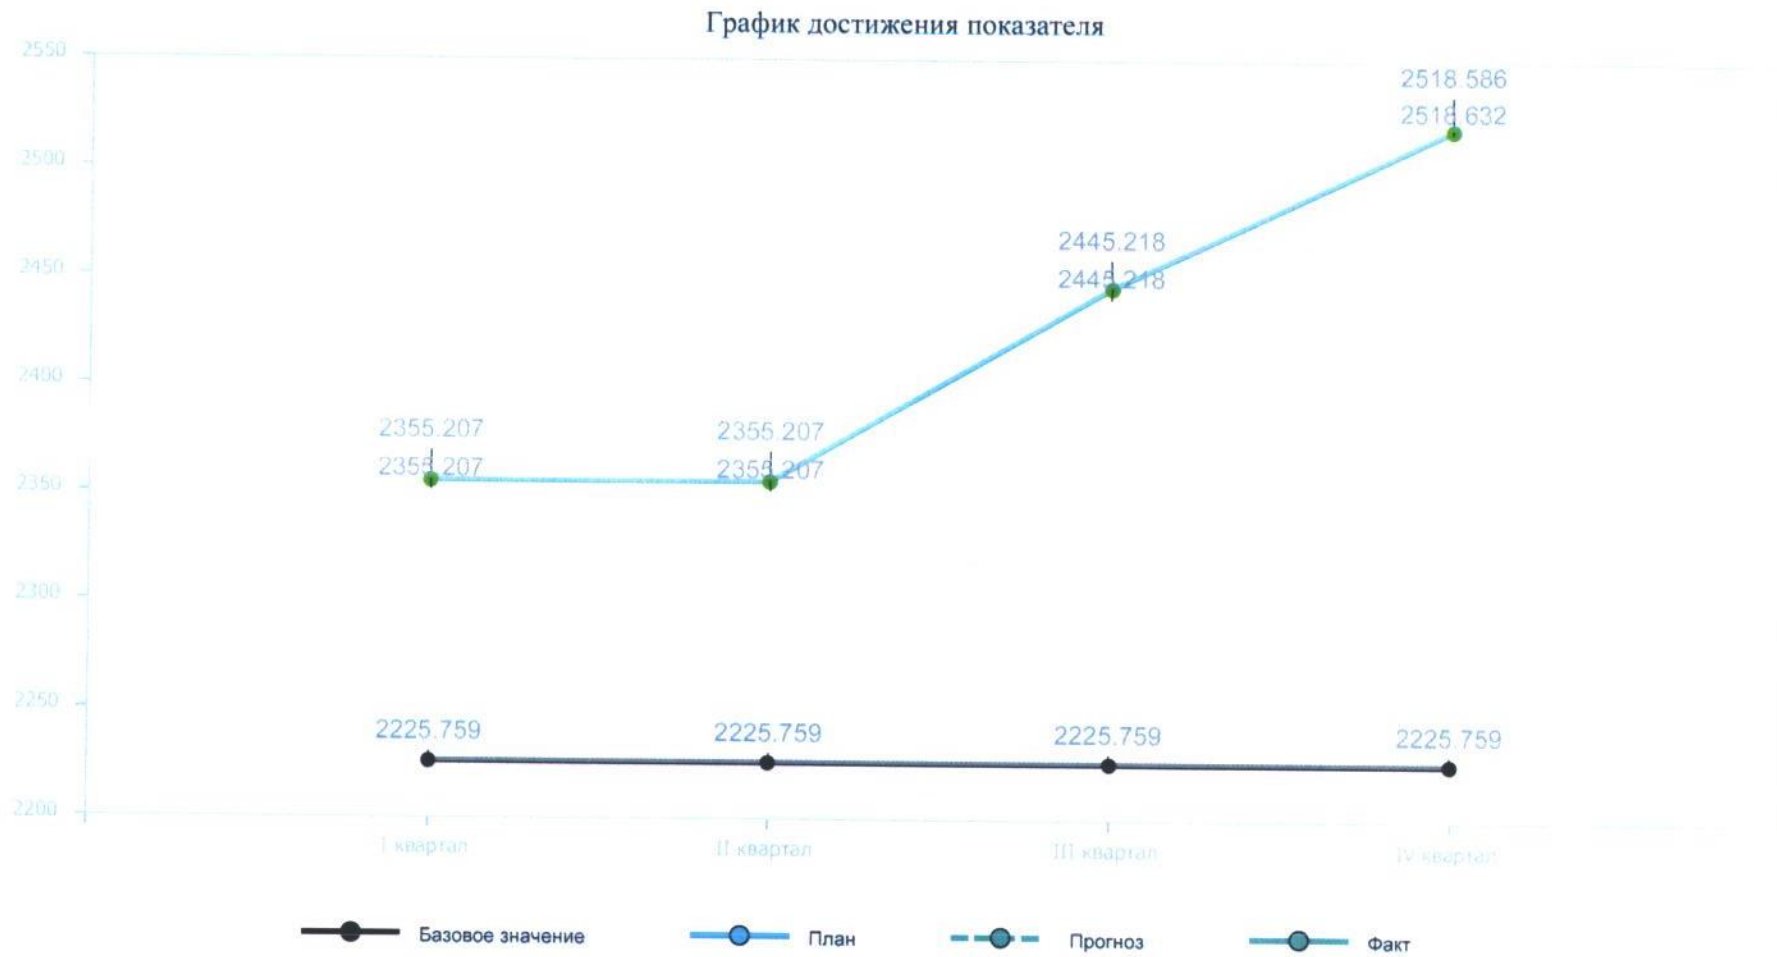


Рис. 11. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

Диаграмма достижения показателя

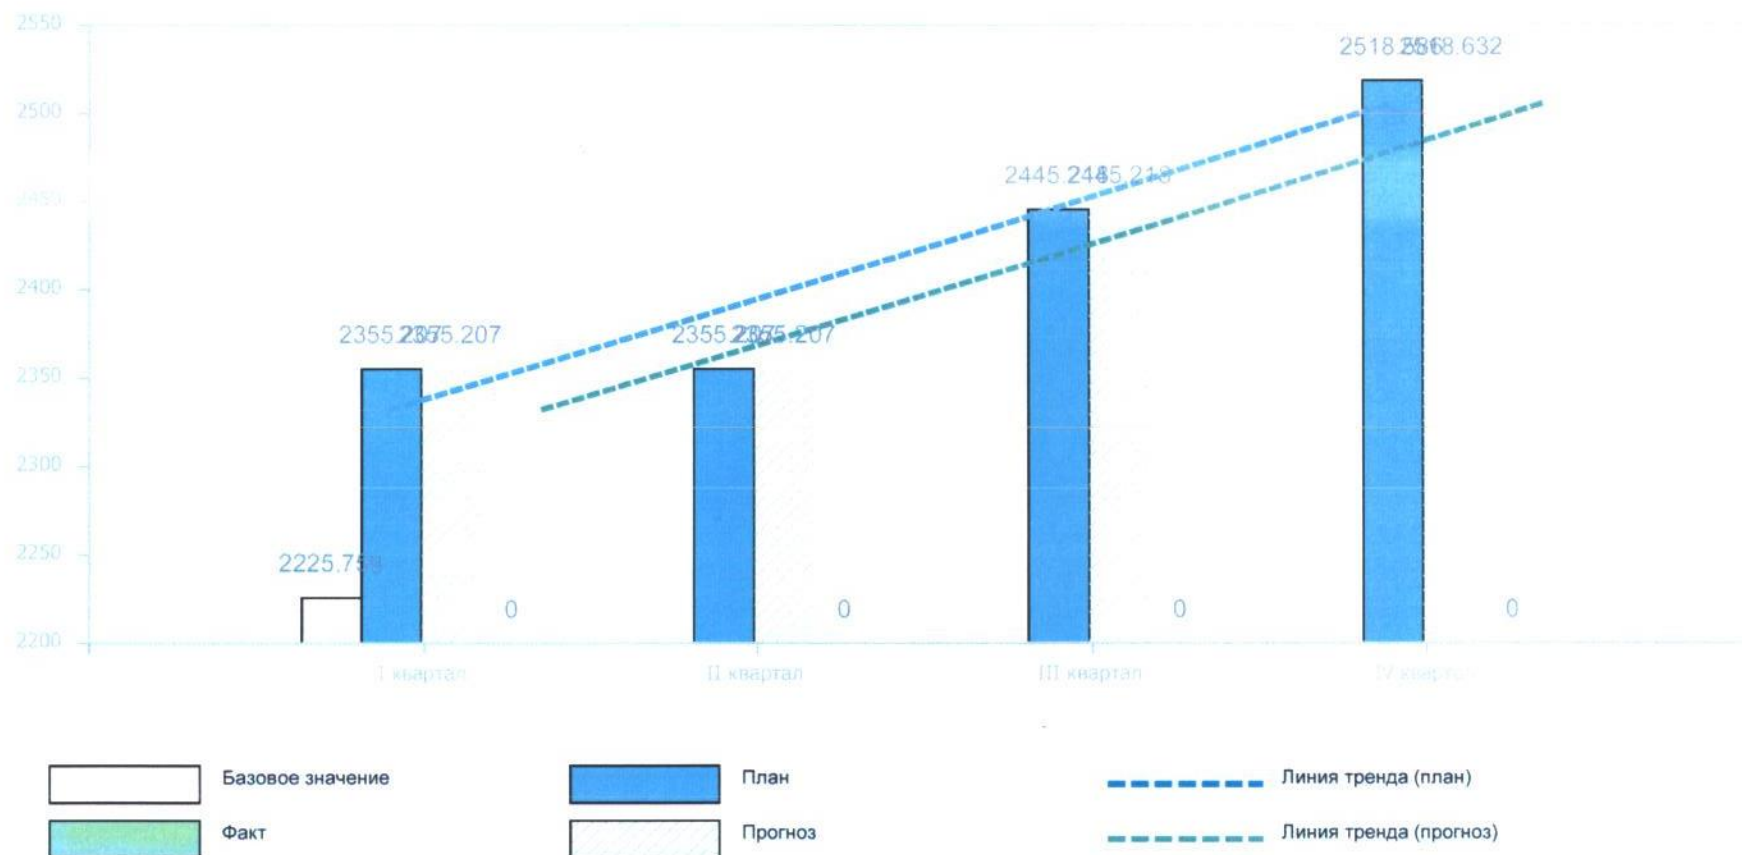


Рис. 12. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям



Рис. 13. Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Диаграмма достижения показателя



Рис. 14. Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

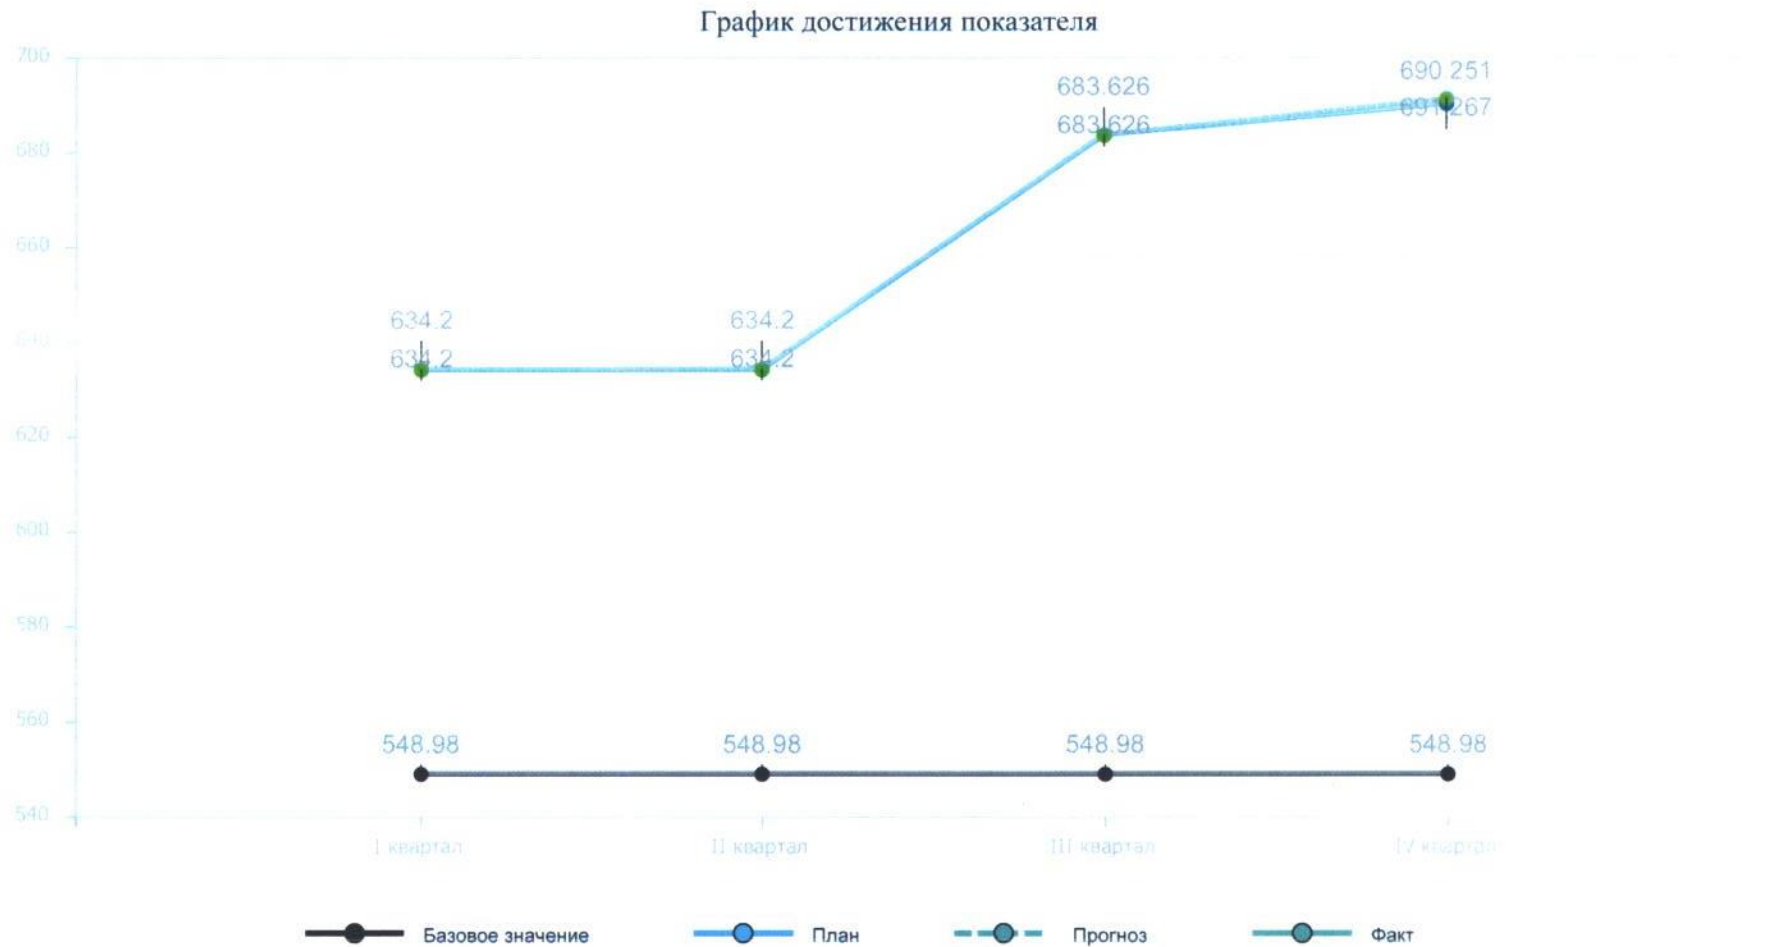


Рис. 15. Протяженность дорожной сети в городские агломерации, соответствующих нормативным требованиям,

Диаграмма достижения показателя

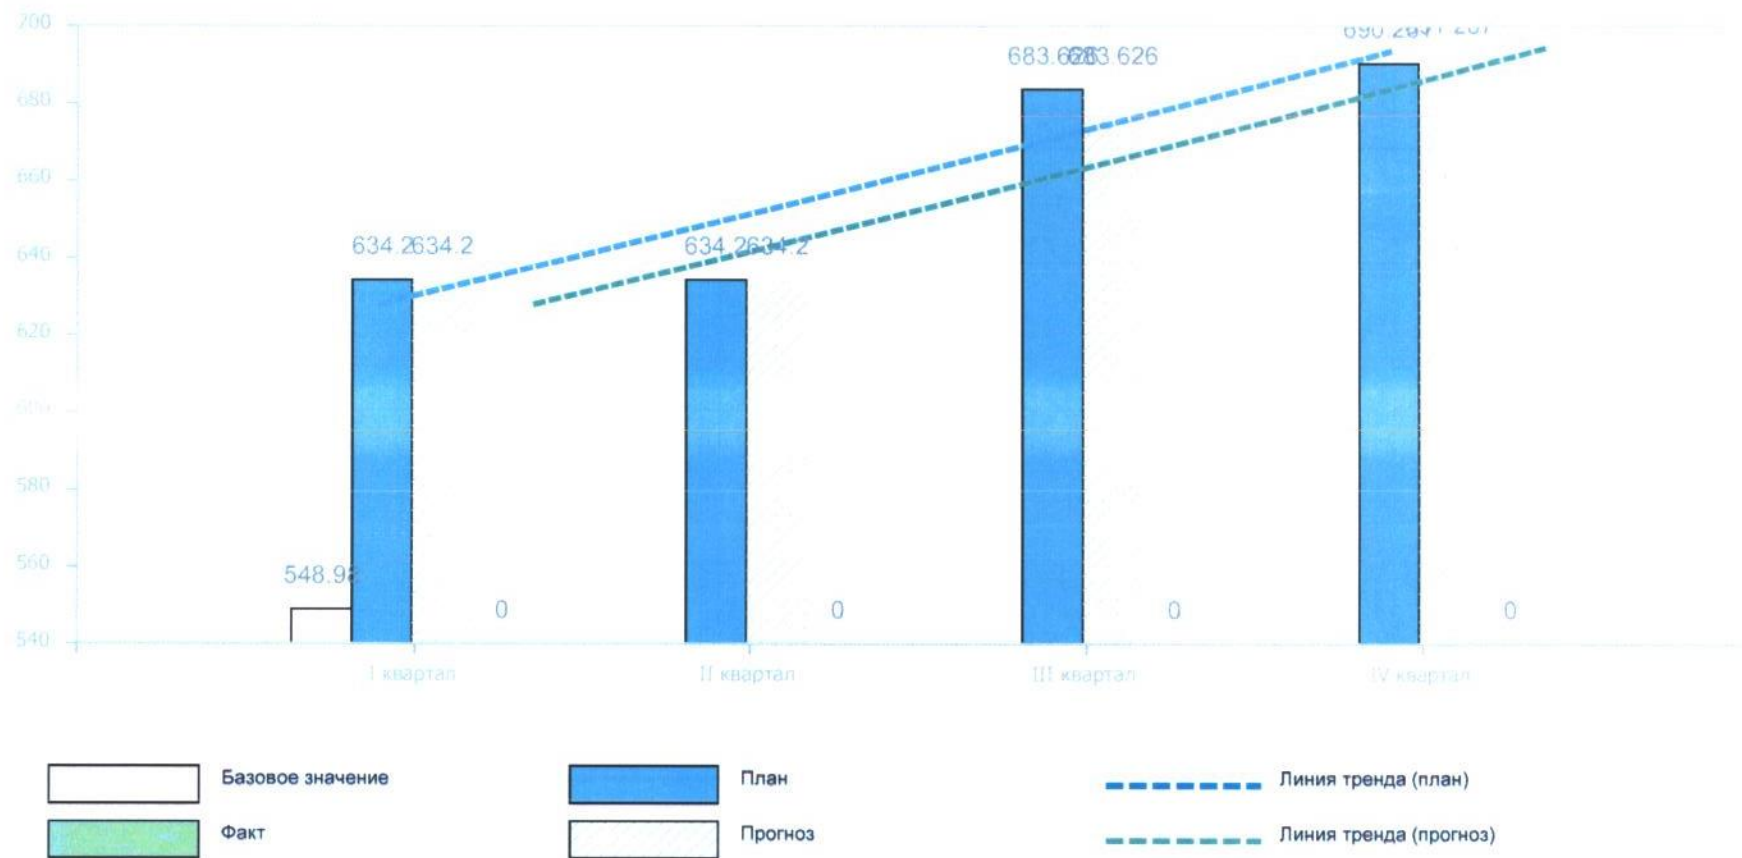


Рис. 16. Протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям,
